


CORREDOR DE COMPETITIVIDAD TRANSVERSAL MEDELLÍN – QUIBDÓ FASE I

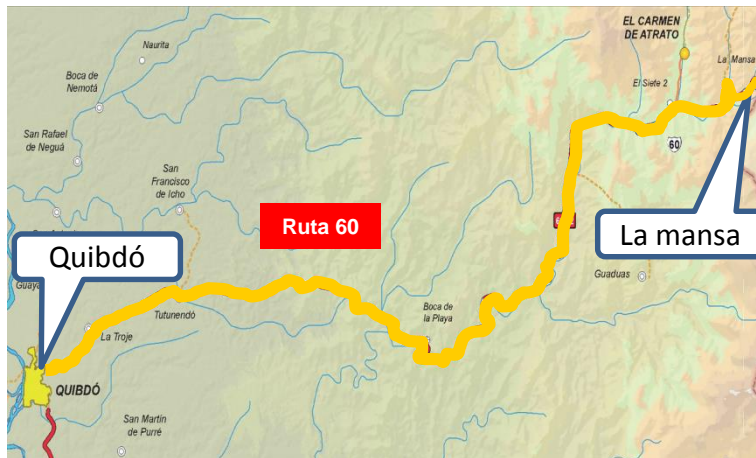

LONGITUD DEL CORREDOR: 127 KM

ITEM	TOTAL
KM PAVIMENTADOS (Km)	25
PUENTES CONSTRUIDOS (Un)	6

Avance: Terminado

CONTRATO DE OBRA:	No. 851 de 2009
CONTRATISTA:	CONSORCIO METROCORREDORES 8
COMPOSICIÓN:	CASS Constructores y CIA S.C.A. Solarte Nacional de Construcciones S.A. SONACOL S.A. Luis Héctor Solarte Solarte
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
VALOR CONTRATO:	\$ 115.751 millones
ORDEN DE INICIO:	Septiembre de 2009
FECHA DE TERMINACIÓN:	Abril de 2014.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: TRANSVERSAL MEDELLÍN - QUIBDÓ Y TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO	No. 1139-2009
INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ "DIEGO LUIS CORDOBA"
REPRESENTANTE LEGAL:	EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA
VALOR ADJUDICADO:	\$ 7.256 millones

VÍA TRANSVERSAL MEDELLÍN - QUIBDÓ (EL DIECIOCHO – CIUDAD BOLÍVAR)

CHOCÓ - ANTIOQUIA



INVERSIONES (Millones)	
Total Contrato Obra	\$ 254.560
Total Contrato Interventoría	\$ 10.980
Total Vigencias de obra	
Vigencia 2012= \$7.249	
Vigencia 2013= \$32.416	
Vigencia 2014= \$69.916	\$ 254.560
Vigencia 2015= \$72.616	
Vigencia 2016= \$72.062	
Total Inversión	\$ 265.540

Longitud de Proyecto 205 Km	
ESTADO DEL CORREDOR	
ESTADO	CANTIDAD
EN EJECUCIÓN	50 KM
EJECUTADOS POR OTROS PROGRAMAS	97 KM
SIN INTERVENIR – SIN FINANCIACIÓN	47 KM
VÍAS PARA LA EQUIDAD	11 KM

INFORMACIÓN GENERAL	
ACTA DE INICIO	08/08/2012
PLAZO	4 AÑOS 3 MESES
FECHA FINALIZACIÓN	07/11/2016
FASE DEL PROYECTO (AVANCE)	79%

ALCANCE			
SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA	AVANCE
EL DIECIOCHO – CIUDAD BOLÍVAR	35Km	Pavimentación	20 Km
	7 Un	Puentes	7 EJ

CONTRATO OBRA 544 DE /2012		
CONSORCIO CORREDORES LAX		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA	40	COLOMBIA
CONINSA RAMÓN H S.A	30	COLOMBIA
S.P INGENIEROS S.A.S	30	COLOMBIA

INTERVENTORÍA 601 DE 2012		
CONSORCIO INTERVAL 2012		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
JOYCO S.A.S	60	COLOMBIA
CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S	40	COLOMBIA

TEMAS DE GESTIÓN		
TEMA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

VÍAS PARA LA EQUIDAD

QUIBDÓ – LA MANSA (QUIBDÓ – EL DIECIOCHO)

CHOCÓ



INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE ADJUDICACIÓN	07/10/2015
INICIO DE OBRAS	04/05/2016
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	30/10/2015
ACTA DE INICIO	03/02/2016
PLAZO	2 Años y 7 meses
FASE DEL PROYECTO (AVANCE)	0,4%

ALCANCE			
SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA	AVANCE
QUIBDO – EL DIECIOCHO	11 KM	Pavimentación	0,2%
QUIBDO – EL DIECIOCHO	1 KM	Puente	0,1%

CONTRATO OBRA 1533 DE 30/10/2015		
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS – SONACOL SAS		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS – SONACOL SAS	100	COLOMBIA

INTERVENTORÍA 1751 DE 23/12/2015		
CONSORCIO ECO 118		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
ECG COLOMBIA SAS	60	ESPAÑA
ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS	39	COLOMBIA
PROES CONSULTORES SA SUCRDAL COLOMBIA	1	COLOMBIA


TEMAS DE GESTIÓN		
TEMA	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
LICENCIA AMBIENTAL	ANLA	CONCEPTO L.A
PREDIOS	SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS – SONACOL SAS	FICHAS PREDIALES
REDES DE SERVICIOS PÚB.		NA
OTROS:		
SOCIAL	MININTERIOR-RESGUARDOS INDÍGENAS	FECHA CONSULTA PREVIA

INVERSIONES (Millones)	
Total Contrato Obra	\$ 80.735
Total Contrato Interventoría	\$ 6.749
Total Vigencias de obra	
Vigencia 2016= \$12.025	
Vigencia 2017= \$34.225	\$ 80.735
Vigencia 2018= \$34.485	
Total Inversión	\$ 87.484

Longitud de Proyecto 205 Km	
ESTADO DEL CORREDOR	
ESTADO	CANTIDAD
VÍAS PARA LA EQUIDAD	11 KM
EN EJECUCIÓN OTROS PROYECTOS	50 KM
EJECUTADOS POR OTROS PROGRAMAS	97 KM
SIN INTERVENIR – SIN FINANCIACIÓN	47 KM

* Cifras en millones a diciembre de 2015

CORREDOR DE COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO FASE I

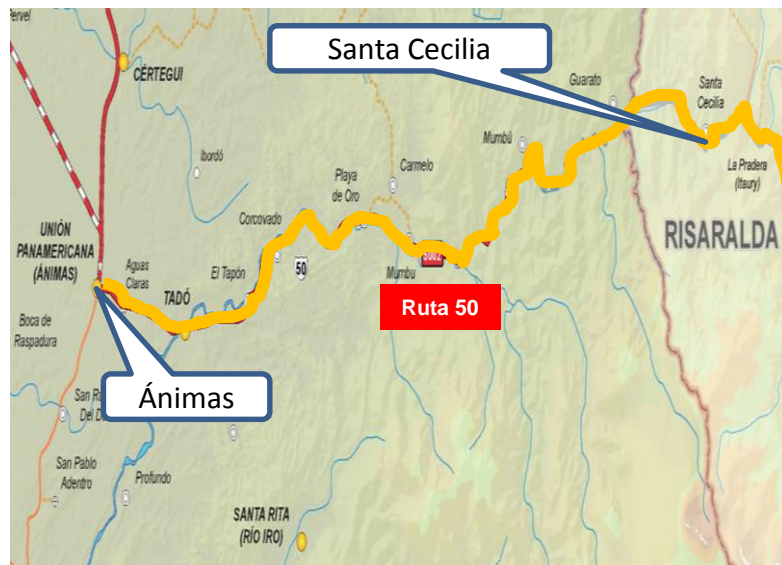

LONGITUD CORREDOR 154 Km

ITEM	TOTAL
PAVIMENTO (Km)	33
PUENTES (Un)	2

CONTRATO DE OBRA:	No. 851 de 2009
CONTRATISTA:	CONSORCIO METROCORREDORES 8
COMPOSICIÓN:	CASS Constructores y CIA S.C.A. Solarte Nacional de Construcciones S.A. SONACOL S.A. Luis Héctor Solarte Solarte
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
VALOR CONTRATO:	\$ 96.116 millones
ORDEN DE INICIO:	Septiembre de 2009
FECHA DE TERMINACIÓN:	Abril de 2014.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: TRANSVERSAL MEDELLÍN - QUIBDÓ Y TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO	No. 1139-2009
INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ "DIEGO LUIS CORDOBA"
REPRESENTANTE LEGAL:	EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA
VALOR ADJUDICADO:	\$ 7.256 millones



Avance: Terminado

VÍA

TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ – LA VIRGINIA)

CHOCÓ - RISARALDA



INVERSIONES (Millones)	
Total Contrato Obra	\$ 246.312
Total Contrato Interventoría	\$ 10.600
Total Vigencias de obra	
Vigencia 2012= \$8.165	
Vigencia 2013= \$29.005	
Vigencia 2014= \$52.505	\$ 246.312
Vigencia 2015= \$78.505	
Vigencia 2016= \$78.129	
Total Inversión	\$ 256.912

* Cifras en millones a diciembre de 2015

Longitud de Proyecto 216 Km	
ESTADO DEL CORREDOR	
ESTADO	CANTIDAD
EN EJECUCIÓN	68 KM
EJECUTADOS POR OTROS PROGRAMAS	102 KM
SIN INTERVENIR – SIN FINANCIACIÓN	23 KM
VÍAS PARA LA EQUIDAD	23 KM

INFORMACIÓN GENERAL	
ACTA DE INICIO	04/09/2012
PLAZO	4 AÑOS 3 MESES
FECHA FINALIZACIÓN	03/12/2016
FASE DEL PROYECTO (AVANCE)	72%

ALCANCE			
SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA	AVANCE
MUMBÚ – LA VIRGINIA	30Km	Pavimentación	23 Km

CONTRATO OBRA 532 DE /2012		
UNIÓN TEMPORAL PROSPERIDAD 2011		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A SUC. COL	49	COLOMBIA
EQUIPO UNIVERSAL S.A.	23	COLOMBIA
EDGARDO NAVARRO VIVES	26	COLOMBIA
CODIFA LTDA	1	COLOMBIA
Puentes y Torones S.A.	1	COLOMBIA

INTERVENTORÍA 677 DE 2012		
CONSORCIO PRIORITARIOS 002		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.	50	COLOMBIA
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES A.I.M LTDA	50	COLOMBIA

TEMAS DE GESTIÓN		
TEMA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

VÍAS PARA LA EQUIDAD

QUIBDÓ-LA VIRGINIA (ÁNIMAS-PUEBLO RICO)

CHOCÓ-RISARALDA



INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE ADJUDICACIÓN	08/10/2015
INICIO DE OBRAS	04/05/2016
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	26/10/2015
ACTA DE INICIO	03/02/2016
PLAZO	2 Años y 7 meses
FASE DEL PROYECTO (AVANCE)	2%

ALCANCE

SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA	AVANCE
ÁNIMAS – PUEBLO RICO	23 KM	Pavimentación	0,6%

CONTRATO OBRA 1516 DE 26/10/2015

CONSORCIO VIAS EQUIDAD 050

INTEGRANTES	%	ORIGEN
HIDALGO E HIDALGO SA	30	ECUADOR
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS	70	COLOMBIA

INTERVENTORIA 1751 DE 23/12/2015

CONSORCIO VIAS PARA LA EQUIDAD 118

INTEGRANTES	%	ORIGEN
GINPROSA COLOMBIA SAS	60	ESPAÑA
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (AIM) LIMITADA	40	COLOMBIA

TEMAS DE GESTIÓN

TEMA	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
LICENCIA AMBIENTAL	CODECHOCÓ - CARDER	PERMISOS AMB
PREDIOS	CONSORCIO VIAS EQUIDAD 050	FICHAS PREDIALES
REDES DE SERVICIOS PÚB.		NA

INVERSIONES (Millones)

Total Contrato Obra	\$ 73.197
Total Contrato Interventoría	\$ 6.674
Total Vigencias de obra	
Vigencia 2016= \$11.100	
Vigencia 2017= \$31.225	\$ 73.197
Vigencia 2018= \$30.872	
Total Inversión	\$ 79.872
Inversión estimada Chocó	\$ 69.120
Inversión estimada Risaralda	\$ 10.752

Longitud de Proyecto 216 Km

ESTADO DEL CORREDOR

ESTADO	CANTIDAD
VÍAS PARA LA EQUIDAD	23 KM
EN EJECUCIÓN OTROS PROYECTOS	68 KM
EJECUTADOS POR OTROS PROGRAMAS	102 KM
SIN INTERVENIR – SIN FINANCIACIÓN	23 KM

* Cifras en millones a diciembre de 2015
